



IRATI

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Observações:

MUNICÍPIO: IRATI
PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA DONA ANTONIETA

EMPRESA EXECUTORA: OBRAS URBANAS JL LTDA - CNPJ 30.850.231/0001-55

Nº da Medição

2

Planilha de Medição



ART DE EXECUÇÃO Nº 9250698-1 - ENG. FRANCISCO ALBERTO COZER - CONTRATO 019/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRAFICO

DATA INÍCIO DA OBRA:	15/02/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO	180 DIAS	Numero medições	2	Periodo da Medição	13/04/2024 A 13/06/2024
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS		VALOR CONTRATO	R\$ 92.208,80	% no Contrato	77,00%	Medição Atual (R\$)	35.506,00
TOTAL DA OBRA:							

ITEMS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO			NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	2,50	R\$ 315,00	787,50		0%	R\$ -	2,50	100,00%	R\$ 787,50	2,50	100,00%	R\$ 787,50
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			R\$ -	-						R\$ -			R\$ -
2	DRENAGEM PLUVIAL			R\$ -	-						R\$ -			R\$ -
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	161,21	R\$ 16,20	2.611,60		0%	R\$ -	161,21	100,00%	R\$ 2.611,60	161,21	100,00%	R\$ 2.611,60
2.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P51, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M	9,00	R\$ 58,90	512,10		0%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 512,10	9,00	100,00%	R\$ 512,10
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM	M	9,00	R\$ 78,00	702,00		0%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 702,00	9,00	100,00%	R\$ 702,00
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P51, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M	89,00	R\$ 95,00	8.455,00		0%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600MM	M	89,00	R\$ 112,00	9.968,00		0%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
2.6	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 1.890,00	3.200,00		0%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 3.200,00	2,00	100,00%	R\$ 3.200,00
2.7	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 1.880,00	3.760,00	1,00	50%	R\$ 1.880,00	1,00	50,00%	R\$ 1.880,00	1,00	100,00%	R\$ 3.760,00
2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	134,90	R\$ 14,00	1.888,60		0%	R\$ -	67,45	50,00%	R\$ 944,30	67,45	50,00%	R\$ 944,30
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES			R\$ -	-						R\$ -			R\$ -
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	680,00	R\$ 2,70	1.836,00	340,00	50%	R\$ 918,00	340,00	50,00%	R\$ 918,00	340,00	100,00%	R\$ 1.836,00
3.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	M3	47,80	R\$ 120,00	5.712,00	23,80	50%	R\$ 2.856,00	23,80	50,00%	R\$ 2.856,00	23,80	100,00%	R\$ 5.712,00
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM Rolo VIBRATORIO	M2	680,00	R\$ 48,00	32.640,00	340,00	50%	R\$ 16.320,00	340,00	50,00%	R\$ 16.320,00	340,00	100,00%	R\$ 32.640,00
3.4	REJUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM	M2	680,00	R\$ 9,40	6.392,00	680,00	100%	R\$ 6.392,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
4	OBRA DE ARTE CORRENTE			R\$ -	-						R\$ -			R\$ -

Juliana



4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, PRÉ MOLDADA TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00	R\$ 70,00	R\$	11.900,00	102,00	60%	R\$ 7.140,00	68,00	40,00%	R\$ 4.760,00	68,00	100,00%	R\$ 11.900,00
5	SINALIZAÇÃO				R\$	-									
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X35CM	UNID	1,00	R\$ 364,00	R\$	364,00		0%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VÁRIA "PARE" COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H = 2,5M)	UNID	2,00	R\$ 400,00	R\$	800,00		0%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	-									
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	680,00	R\$ 1,00	R\$	680,00		0%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA:					R\$	92.208,80			R\$ 35.506,00			R\$ 36.491,50			R\$ 70.997,50
IRATI,	quinta-feira, 13 de junho de 2024	Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados													
<p style="text-align: right;">  ENG. FABIANA GRANDI CREA/SC 125595-6 Mat. 14200/01 Responsável Técnico pela Fiscalização </p>															
<p style="text-align: right;">  Fabiana Grandi Empresa Contratada </p>															
<p style="text-align: right;"> Medição aprovada para liberação Prefeito de Irati </p>															



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 02

CONTRATANTE: Município de Irati


CONTRATADO: OBRAS URBANAS JL LTDA

CNPJ: 30.850.231./0001-55

OBRA: REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA
DONA ANTONIETA

AUTOR DO PROJETO: AM NOROESTE

IMAGENS:

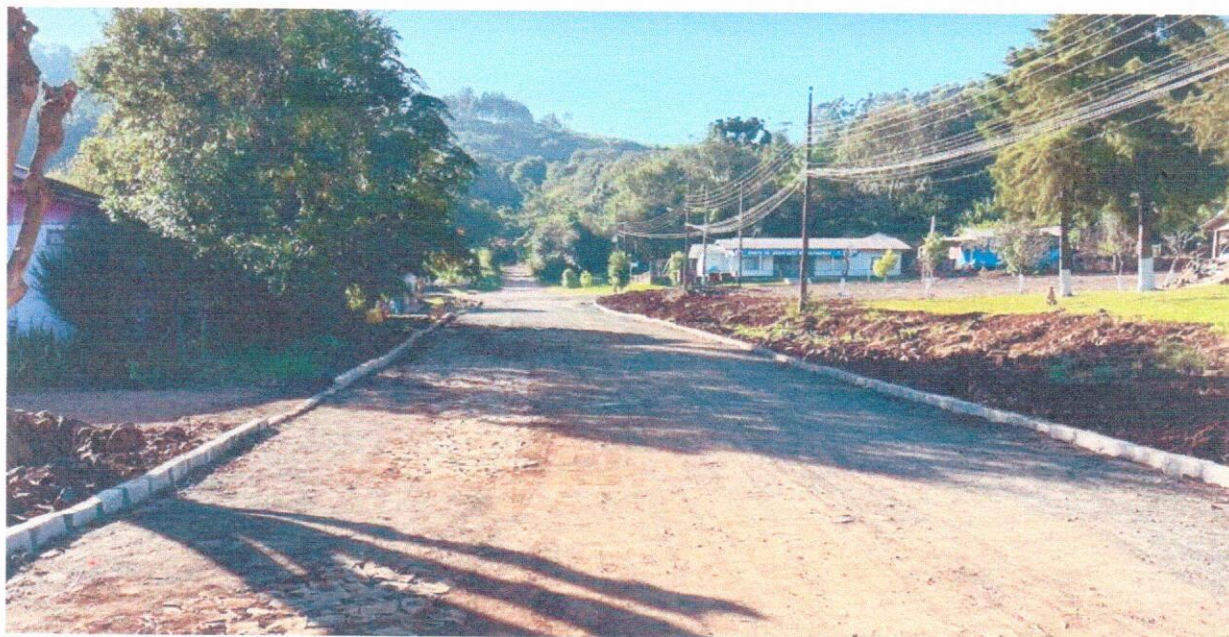

R



Irati, 13 DE JUNHO de 2024.

Fabiana

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:1	DATA: 22/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	PROCESSO LICITATÓRIO Nº:153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:50	PRAZO RESTANTE:40
N.º OPERÁRIOS:			
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Escavação			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.05.14 14:12:09 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:2	DATA:23/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:51	PRAZO RESTANTE:39
N.º OPERÁRIOS:3			
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Escavação			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.05.14 14:13:28 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:3	DATA:24/04/24
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:52	PRAZO RESTANTE:38	N.º OPERÁRIOS:5
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.06.14 14:13:47 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:4	DATA:25/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:53	PRAZO RESTANTE:37	N.º OPERÁRIOS:5
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.06.14 14:14:04 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:5	DATA:29/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:57	PRAZO RESTANTE:33
N.º OPERÁRIOS:4			
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Reaterro			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:6	DATA:30/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:58	PRAZO RESTANTE:32
N.º OPERÁRIOS:6			
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 7	DATA: 02/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 59	PRAZO RESTANTE: 31	N.º OPERÁRIOS: 0
TEMPO:	MANHÃ: X CHUVA	TARDE:	X CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Condições climáticas desfavoráveis			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960	Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Dados: 2024.05.14 14:15:24 -03'00'	
		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 8	DATA: 03/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 60	PRAZO RESTANTE: 30	N.º OPERÁRIOS: 0
TEMPO:	MANHÃ: X CHUVA	TARDE:	X CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Condições climáticas desfavoráveis			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960	Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960 Dados: 2024.05.14 14:15:47 -03'00'	
		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:9	DATA:06/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:63	PRAZO RESTANTE:27	N.º OPERÁRIOS:3
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.06.14 14:16:00 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:10	DATA:07/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:64	PRAZO RESTANTE:26	N.º OPERÁRIOS:4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.06.14 14:16:00 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 11	DATA: 08/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias		TEMPO DECORRIDO: 65	PRAZO RESTANTE: 25
		N.º OPERÁRIOS: 8	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio e pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
<small>FRANCISCO ALBERTO</small> <small>COZER: 07134375960</small>		<small>Ativado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO</small> <small>COZER: 07134375960</small> <small>Código: 2024.05.14 14:16:42 -03'00'</small>	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 12	DATA: 09/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias		TEMPO DECORRIDO: 66	PRAZO RESTANTE: 24
		N.º OPERÁRIOS: 8	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
<small>FRANCISCO ALBERTO</small> <small>COZER: 07134375960</small>		<small>Ativado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO</small> <small>COZER: 07134375960</small> <small>Código: 2024.05.14 14:17:05 -03'00'</small>	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:13	DATA:10/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:67	PRAZO RESTANTE:23	N.º OPERÁRIOS:8
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER-07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER-07134375960. Dados: 2024.05.14 14:17:23 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:14	DATA:13/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:68	PRAZO RESTANTE:22	N.º OPERÁRIOS:4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER-07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER-07134375960. Dados: 2024.06.14 16:17:41 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 15	DATA: 14/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 69	PRAZO RESTANTE: 21	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Compactação e rejuntamento			
Rubrica da Empreiteira:	<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 16	DATA: 15/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 70	PRAZO RESTANTE: 20	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Limpeza e organização da obra			
Rubrica da Empreiteira:	<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:1	DATA: 22/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	PROCESSO LICITATÓRIO N°:153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:50	PRAZO RESTANTE:40	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Escavação			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.05.14 14:12:59 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:2	DATA:23/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:51	PRAZO RESTANTE:39	N.º OPERÁRIOS:3
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Escavação			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.05.14 14:13:28 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:3	DATA:24/04/24
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:52	PRAZO RESTANTE:38
		N.º OPERÁRIOS:5	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.06.14 14:13:47 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:4	DATA:25/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:53	PRAZO RESTANTE:37
		N.º OPERÁRIOS:5	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.06.14 14:14:04 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 5	DATA: 29/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias		TEMPO DECORRIDO: 57	PRAZO RESTANTE: 33
		N.º OPERÁRIOS: 4	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Reaterro			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 6	DATA: 30/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias		TEMPO DECORRIDO: 58	PRAZO RESTANTE: 32
		N.º OPERÁRIOS: 6	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 7	DATA: 02/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 59	PRAZO RESTANTE: 31	N.º OPERÁRIOS: 0
TEMPO:	MANHÃ: X CHUVA	TARDE:	X CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Condições climáticas desfavoráveis			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.06.14 14:15:24 -03'00'	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 8	DATA: 03/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 60	PRAZO RESTANTE: 30	N.º OPERÁRIOS: 0
TEMPO:	MANHÃ: X CHUVA	TARDE:	X CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Condições climáticas desfavoráveis			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.06.14 14:15:42 -03'00'	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:9	DATA:06/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:63	PRAZO RESTANTE:27
N.º OPERÁRIOS:3			
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.05.14 14:16:00 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:10	DATA:07/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:64	PRAZO RESTANTE:26
N.º OPERÁRIOS:4			
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE:	X BOM
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.05.14 14:16:22 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:11	DATA:08/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:65	PRAZO RESTANTE:25
		N.º OPERÁRIOS:8	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Execução de meio fio e pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:12	DATA:09/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:66	PRAZO RESTANTE:24
		N.º OPERÁRIOS:8	
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:13	DATA:10/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:67	PRAZO RESTANTE:23	N.º OPERÁRIOS:8
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.05.14 14:17:25 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:14	DATA:13/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lidio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:68	PRAZO RESTANTE:22	N.º OPERÁRIOS:4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.05.14 14:17:25 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA



ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 15	DATA: 14/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 69	PRAZO RESTANTE: 21	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Compactação e rejuntamento			
Rubrica da Empreiteira:	<small>Assinada de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 16	DATA: 15/05/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Lídio Marafon	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	TEMPO DECORRIDO: 70	PRAZO RESTANTE: 20	N.º OPERÁRIOS: 4
TEMPO:	MANHÃ: X BOM	TARDE: X BOM	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Limpeza e organização da obra			
Rubrica da Empreiteira:	<small>Assinada de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER: 07134375960</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.850.231/0001-55
Razão Social: OBRAS URBANAS JL LTDA
Endereço: EST FLOR SN SALA / IRATI / IRATI / SC / 89856-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060803145028610885

Informação obtida em 14/06/2024 10:35:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.850.231/0001-55

Certidão nº: 41764859/2024

Expedição: 14/06/2024, às 10:33:34

Validade: 11/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.850.231/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **OBRAS URBANAS JL LTDA**
CNPJ/CPF: **30.850.231/0001-55**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140181449944**
Data de emissão: **14/06/2024 10:33:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/12/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 14/06/2024 10:33:05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **OBRAS URBANAS JL LTDA**
CNPJ: **30.850.231/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:11 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2024.

Código de controle da certidão: **16F7.A8B6.BF56.4CE4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
