



IRATI

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Observações:

ART DE EXECUÇÃO Nº 9250698-1 - ENG. FRANCIS TO ALBERTO COZER - CONTRATO 019/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO: **REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA DONA ANTONIETA**

PROJETO: **IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA DONA ANTONIETA**

EMPRESA EXECUTORA: **OBRAS URBANAS JL LTDA - CNPJ 30.850.231/0001-55**

DATA INÍCIO DA OBRA: **15/02/2024**

FRASE DE RECURSOS: **RECURSOS PRÓPRIOS**

TOTAL DA OBRA: **R\$**

EXECUTADO

EXECUTADO ANTERIORES

ACUMULADO MAS MEDIÇÕES ANTERIORES

ACUMULADO TOTAL

Nº da Medição: **3**

Planilha de Medição

Período da Medição: **13/06/2024 a 08/10/2024**

% no Contrato: **100,00%**

Medição Atual (R\$): **12.659,12**

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO				ACUMULADO MAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
1	DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50	R\$ 315,00	R\$ 787,50		0%	R\$ -	2,50	100,00%	R\$ 787,50		2,50	100,00%	R\$ 787,50		R\$ 787,50
1.1				R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -
2	DRENAGEM PLUVIAL																
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M³	161,21	R\$ 16,20	R\$ 2.611,60		0%	R\$ -	161,21	100,00%	R\$ 2.611,60		161,21	100,00%	R\$ 2.611,60		R\$ 2.611,60
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM	M	95,00	R\$ 58,90	R\$ 5.405,50	86,00	91%	R\$ 4.893,40	9,00	100,00%	R\$ 512,10		9,00	100,00%	R\$ 5.405,50		R\$ 5.405,50
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM	M	95,00	R\$ 78,00	R\$ 7.410,00	86,00	91%	R\$ 6.708,00	9,00	100,00%	R\$ 702,00		9,00	100,00%	R\$ 7.410,00		R\$ 7.410,00
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M		R\$ 95,00	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -		R\$ -
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600MM	M		R\$ 112,00	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -		R\$ -
2.6	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00		0%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 3.200,00		2,00	100,00%	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00
2.7	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00		0%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 3.760,00		1,00	100,00%	R\$ 3.760,00		R\$ 3.760,00
2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERIA (CAPACIDADE DA CACAEMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	94,43	R\$ 14,00	R\$ 1.322,02	26,98	29%	R\$ 377,72	67,45	50,00%	R\$ 944,30		67,45	100,00%	R\$ 1.322,02		R\$ 1.322,02
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES																
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	880,00	R\$ 2,70	R\$ 1.836,00		0%	R\$ -	340,00	100,00%	R\$ 1.836,00		340,00	100,00%	R\$ 1.836,00		R\$ 1.836,00
3.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=70M	M3	47,60	R\$ 120,00	R\$ 5.712,00		0%	R\$ -	23,80	100,00%	R\$ 5.712,00		23,80	100,00%	R\$ 5.712,00		R\$ 5.712,00
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM Rolo VIBRATORIO	M2	690,00	R\$ 48,00	R\$ 32.640,00		0%	R\$ -	340,00	100,00%	R\$ 32.640,00		340,00	100,00%	R\$ 32.640,00		R\$ 32.640,00
3.4	RELUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5CM	M2	690,00	R\$ 9,40	R\$ 6.392,00		0%	R\$ -		100,00%	R\$ 6.392,00			100,00%	R\$ 6.392,00		R\$ 6.392,00
4	OBRA DE ARTE CORRENTE																

Com

F. Pulcini Da S. L. Lda

4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, PRÉ-MOLDADA TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00	R\$ 70,00	R\$	11.900,00		0%	R\$	-	68,00	100,00%	R\$ 11.900,00	68,00	100,00%	R\$ 11.900,00	
5	SINALIZAÇÃO				R\$	-										R\$	-
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	0,00	R\$ 364,00	R\$	-		#DIV/0!	R\$	-		0,00%	R\$	-		R\$	-
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE" COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 59CM E H= 25M)	UNID	0,00	R\$ 400,00	R\$	-		#DIV/0!	R\$	-		0,00%	R\$	-		R\$	-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	-						0,00%	R\$	-		R\$	-
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	680,00	R\$ 1,00	R\$	680,00		100%	R\$	680,00		100,00%	R\$	680,00		R\$	680,00
TOTAL GERAL DA OBRA:					R\$	83.656,62			R\$	12.639,12			R\$	70.997,50		R\$	83.656,62
IRATI, terça-feira, 8 de outubro de 2024				Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação					
<i>Fabiana Grandi</i> Empresa Contratada				<i>Fabiana Grandi</i> Responsável Técnico pela Fiscalização ENG. FABIANA GRANDI CREASC 125595-6 Mat. 14200/01				<i>pm</i> Prefeito de Irati									

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 03

CONTRATANTE: Município de Irati


CONTRATADO: OBRAS URBANAS JL LTDA

CNPJ: 30.850.231./0001-55

OBRA: REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DA RUA
DONA ANTONIETA

AUTOR DO PROJETO: AM NOROESTE

IMAGENS:

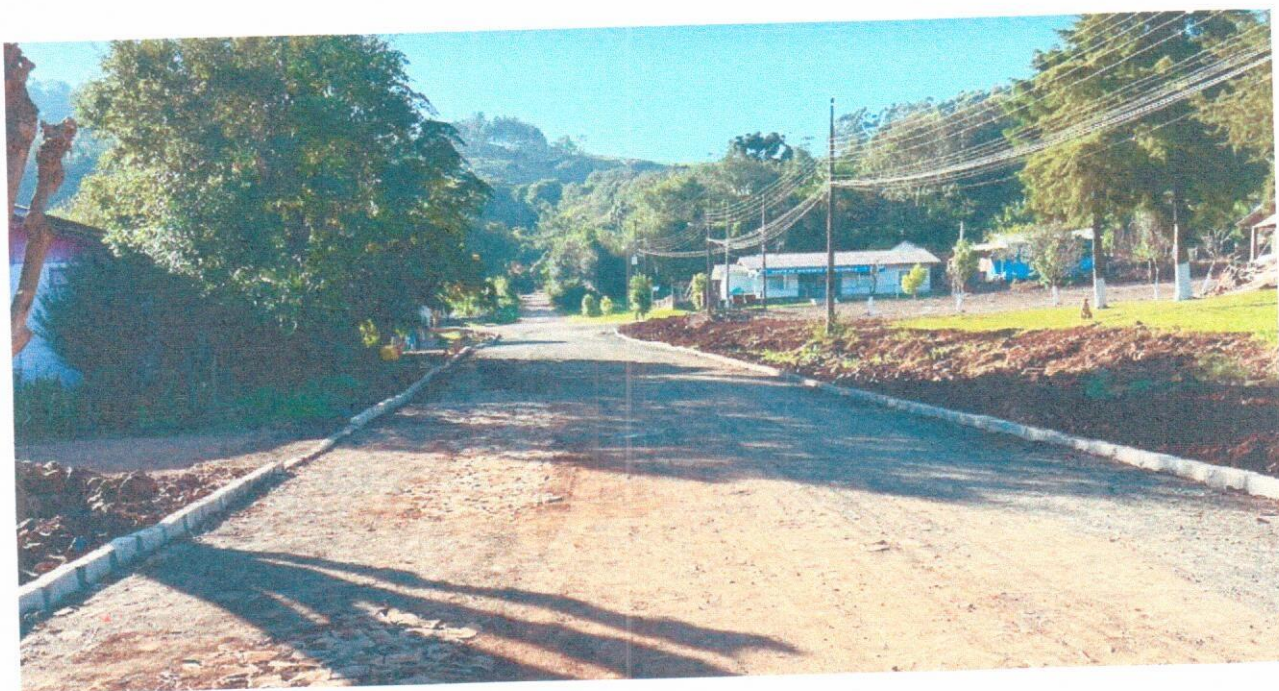

R



Irati, 08 de outubro de 2024.

Fabiana Grando

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6



MUNICIPIO DE IRATI ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA


Contrato: 019/2024 – PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA DONA ANTONIETA – SETE DE SETEMBRO
Bem Público: RUA DONA ANTONIETA
Contratante: MUNICÍPIO DE IRATI
Contratado: OBRAS URBANAS JL LTDA
Órgão Fiscalizador: MUNICÍPIO DE IRATI
Valor do Contrato (R\$): 83.656,62
Período do Contrato: 15/02/2024 A 08/10/2024

Os abaixo-assinados, sendo um deles responsável pela fiscalização da obra do contrato, Eng. Fabiana Grando, e outro, o responsável pela empresa executora Julcinei da Silva, tendo em vista que o objeto encontra-se concluído, conforme comunicação escrita do contratado, declaram e atestam o que segue:

1. Que a análise realizada comprovou a conclusão do objeto de acordo com os termos contratuais;
2. Que, face ao exposto, concluem pela aceitação provisória, iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Irati, 08 de outubro de 2024.

Profissionais:



Fabiana Grando
Engenheiro Fiscal



OBRAS URBANAS JL

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:1	DATA:11/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:11	PRAZO RESTANTE:79
		N.º OPERÁRIOS:3	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Serviços preliminares de limpeza e escavação			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER/07134375960 Data: 2024.03.13 22:14:32 -03'00'	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:2	DATA:12/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias		TEMPO DECORRIDO:12	PRAZO RESTANTE:78
		N.º OPERÁRIOS:3	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Escavação			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER/07134375960 Data: 2024.03.13 22:14:32 -03'00'	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:3	DATA:13/03/24
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:13	PRAZO RESTANTE:77	N.º OPERÁRIOS:5
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:4	DATA:14/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:14	PRAZO RESTANTE:76	N.º OPERÁRIOS:5
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Drenagem			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 6	DATA: 25/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias		TEMPO DECORRIDO: 25	PRAZO RESTANTE: 65
		N.º OPERÁRIOS: 4	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Reaterro			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA: 6	DATA: 26/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias		TEMPO DECORRIDO: 26	PRAZO RESTANTE: 64
		N.º OPERÁRIOS: 6	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM
		CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos e meio fio			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:7	DATA:27/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:27	PRAZO RESTANTE:63	N.º OPERÁRIOS:6
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos e meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.03.27 13:23:18 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:8	DATA:28/03/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:28	PRAZO RESTANTE:62	N.º OPERÁRIOS:6
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Bocas de lobos e meio fio			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	<small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Data: 2024.03.28 13:23:18 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:9	DATA:02/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:32	PRAZO RESTANTE:58	N.º OPERÁRIOS:8
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER/07134375960 Data: 2024.06.13 23:16:51 -03'00'</small> COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC			
		FOLHA:10	DATA:03/04/24
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:33	PRAZO RESTANTE:57	N.º OPERÁRIOS:8
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Pavimentação em pedras			
Rubrica da Empreiteira: FRANCISCO ALBERTO <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER/07134375960 Data: 2024.06.13 23:17:01 -03'00'</small> COZER:07134375960		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:11	DATA:04/04/2024	
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023		
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI		
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:34	PRAZO RESTANTE:56	N.º OPERÁRIOS:8	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
Pavimentação em pedras				
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC				
		FOLHA:12	DATA:05/04/2024	
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023		
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI		
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:35	PRAZO RESTANTE:55	N.º OPERÁRIOS:8	
TEMPO:	MANHÃ: BOM	CHUVA	TARDE: BOM	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
Pavimentação em pedras e compactação				
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal Irati - SC

		FOLHA:13	DATA:08/04/2024
EMPREITEIRA:	Obras Urbanas JL LTDA	Processo Licitatório 153/2023	
OBRA:	Pavimentação Pedras irregulares Rua Dona Antonieta	CIDADE: IRATI	
PRAZO CONTRATUAL:90 dias	TEMPO DECORRIDO:38	PRAZO RESTANTE:52	N.º OPERÁRIOS:6
TEMPO:	MANHÃ: BOM CHUVA	TARDE: BOM CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Sinalização vertical e limpeza da obra			
Rubrica da Empreiteira:	FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 <small>Assinado de forma digital por FRANCISCO ALBERTO COZER:07134375960 Dados: 2024.06.13 20:21:02 -03'00'</small>	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Rua João Beux Sobrinho, 385 - Centro

Data: 08/10/2024 11h18min

Número	Validade
339	07/12/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

OBRAS URBANAS JL LTDA CNPJ: 30850231000155

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 4043 - OBRAS URBANAS JL LTDA
Endereço: Linha Flor, S/N - Bairro Interior - Compl. AP/E: SALA - CEP 89.856-000

Código de Controle

CW2XS5K1FWY8EID1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://www.irati.sc.gov.br>

Irati (SC), 08 de Outubro de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.850.231/0001-55

Certidão nº: 68826610/2024

Expedição: 08/10/2024, às 11:19:48

Validade: 06/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAS URBANAS JL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.850.231/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **OBRAS URBANAS JL LTDA**
CNPJ/CPF: **30.850.231/0001-55**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140181449944**
Data de emissão: **14/06/2024 10:33:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/12/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OBRAS URBANAS JL LTDA
CNPJ: 30.850.231/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:33:11 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2024.

Código de controle da certidão: **16F7.A8B6.BF56.4CE4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.850.231/0001-55
Razão Social: OBRAS URBANAS JL LTDA
Endereço: EST FLOR SN SALA / IRATI / IRATI / SC / 89856-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100121205028610840

Informação obtida em 08/10/2024 11:16:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
