




| MUNICÍPIO:   |  | IRATI  |          |                   |                |            |   |                 |        |                                   |             | Planilha de Medição     |   |                 |          |         |            |
|--|--|--|----------|-------------------|----------------|------------|---|-----------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---|-----------------|----------|---------|------------|
| PROJETO:   |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - RUA SÃO JORGE |          |                   |                |            |   |                 |        |                                   |             | 2                       |   |                 |          |         |            |
| EMPRESA EXECUTORA:   |  | VIA ASFALTOS LTDA - CNPJ 49.539.605/0001-44    |          |                   |                |            |   |                 |        |                                   |             | Nº da Medição           |   |                 |          |         |            |
| Observações:   |  | DATA INÍCIO DA OBRA:                           |          | PRAZO DE EXECUÇÃO |                | 120 DIAS   |   | Número medições |        | Período da Medição                |             | 24/06/2024 a 24/07/2024 |   |                 |          |         |            |
| ART DE EXECUÇÃO Nº 9320600-8 - ENG. THIAGO FELIPE SOARES DUTRA - CONTRATO 81/2024 - DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  | FONTE DE RECURSOS:                             |          | VALOR CONTRATO    |                | 333.032,69 |   | % no Contrato   |        | 41,20%                            |             | Medição Atual (R\$)     |   |                 |          |         |            |
|  |  | TOTAL DA OBRA:                                 |          | R\$               |                | 333.032,69 |   | R\$             |        | 137.220,42                        |             |                         |   |                 |          |         |            |
| ITENS  | SERVIÇOS LICITADOS   | CONTRATADO                                     |          |                   |                | NO PERÍODO |   |                 |        | ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |             |                         |   | ACUMULADO TOTAL |          |         |            |
|  |  | UNID.  | QUANT.   | PREÇO Unitário    | PREÇO TOTAL    | QUANT.     | % | PREÇO TOTAL     | QUANT. | %                                 | PREÇO TOTAL | QUANT.                  | % | PREÇO TOTAL     | QUANT.   | %       |            |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES  |  |          |                   |                |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 1.1  | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M2   | 2,50     | R\$ 250,00        | R\$ 625,00     |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   | R\$ 625,00      | 2,50     | 100,00% | R\$ 625,00 |
| 1.2  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE   | M2   | 1712,00  | R\$ 0,47          | R\$ 804,64     |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   | R\$ 804,64      | 1.712,00 | 100,00% | R\$ 804,64 |
| 2.0  | DRENAGEM   |  |          |                   |                |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 2.1  | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSÁ, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM  | M  | 289,00   | R\$ -             | R\$ -          |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 2.2  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)     | M  | 289,00   | R\$ 50,97         | R\$ 14.730,33  |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 2.3  | CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TUJOLOMACIO1,13X1,13X1,45/C/GRNELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNID   | 13,00    | R\$ 1.239,30      | R\$ 16.110,90  |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 2.4  | REA TERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA   | M3   | 310,50   | R\$ 24,52         | R\$ 7.613,46   |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.0  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ  |  |          |                   |                |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.1  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO   | M2   | 1926,00  | R\$ 3,17          | R\$ 6.105,42   |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.2  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE   | M3   | 327,42   | R\$ 29,21         | R\$ 9.563,94   |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.3  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESURA DE 30CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE  | M3   | 173,34   | R\$ 231,08        | R\$ 40.055,41  |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.4  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM)  | M3xKM  | 15022,80 | R\$ 3,05          | R\$ 45.819,54  |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.5  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3xKM) DMT UTILIZADO 30KM  | M3xKM  | 15022,80 | R\$ 1,21          | R\$ 18.177,59  |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.6  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASPHALTO DILUÍDO CM-30 RE-2G  | M2   | 1926,00  | R\$ 11,31         | R\$ 21.783,06  |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.7  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RE-2G   | M2   | 1712,00  | R\$ 4,20          | R\$ 7.190,40   |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.8  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM 4,0CM DE ESPESURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE  | M3   | 68,48    | R\$ 1.925,55      | R\$ 131.861,66 |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.9  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM)  | M3xKM  | 2054,40  | R\$ 3,05          | R\$ 6.265,92   |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 3.10   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3xKM) DMT UTILIZADO 30KM  | M3xKM  | 2054,40  | R\$ 1,21          | R\$ 2.485,82   |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 4.0  | SINALIZAÇÃO  |  |          |                   |                |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 4.1  | PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 30CM, APLICAÇÃO MANUAL   | M2   | 43,80    | R\$ 28,91         | R\$ 1.266,26   |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 4.2  | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)  | UNID   | 2,00     | R\$ 397,88        | R\$ 795,76     |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |
| 4.3  | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO  | M2   | 2,00     | R\$ 397,88        | R\$ 795,76     |            |   |                 |        |                                   |             |                         |   |                 |          |         |            |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



| 4.4   | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO | UND | 1,00    | R\$ 433,98 | R\$ | 433,98 | 0%      | R\$ | - | R\$ | - | 0,00%   | R\$        | -   |            |     |          |     |           |
|---|---|-----|---------|------------|-----|--------|---------|-----|---|-----|---|---------|------------|-----|------------|-----|----------|-----|-----------|
| 5.0   | SERVIÇOS FINAIS   |     |         |            |     |        | #DIV/0! |     |   | R\$ | - | #DIV/0! | R\$        | -   |            |     |          |     |           |
| 3.1   | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | M2  | 1712,00 | R\$ 0,32   | R\$ | 547,84 | 0%      | R\$ | - | R\$ | - | 0,00%   | R\$        | -   |            |     |          |     |           |
| TOTAL GERAL DA OBRA:  |   |     |         |            |     |        |         |     |   |     |   | R\$     | 333.032,69 | R\$ | 137.220,42 | R\$ | 6.313,98 | R\$ | 93.344,77 |
| <b>Local: IRATI, quarta-feira, 24 de julho de 2024</b><br>Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados                 |   |     |         |            |     |        |         |     |   |     |   |         |            |     |            |     |          |     |           |
| <br>Responsável Técnico pela Fiscalização                  |   |     |         |            |     |        |         |     |   |     |   |         |            |     |            |     |          |     |           |
| Atesto que os serviços foram executados e aceitos   |   |     |         |            |     |        |         |     |   |     |   |         |            |     |            |     |          |     |           |
| <br>ENG. FABIANA GRANDI CREA/ISC 125505-6<br>Mat. 14200/01 |   |     |         |            |     |        |         |     |   |     |   |         |            |     |            |     |          |     |           |
| Responsável Técnico pela Fiscalização   |   |     |         |            |     |        |         |     |   |     |   |         |            |     |            |     |          |     |           |
| Medição aprovada para liberação   |   |     |         |            |     |        |         |     |   |     |   |         |            |     |            |     |          |     |           |
| <br>Prefeito de Irati  |   |     |         |            |     |        |         |     |   |     |   |         |            |     |            |     |          |     |           |

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO 02

**CONTRATANTE:** Município de Irati

**CONTRATADO:** VIA ASFALTOS LTDA

CNPJ 49.539.605/0001-44

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – RUA SÃO JORGE

**AUTOR DO PROJETO:** AM NOROESTE


### IMAGENS:



Am


K



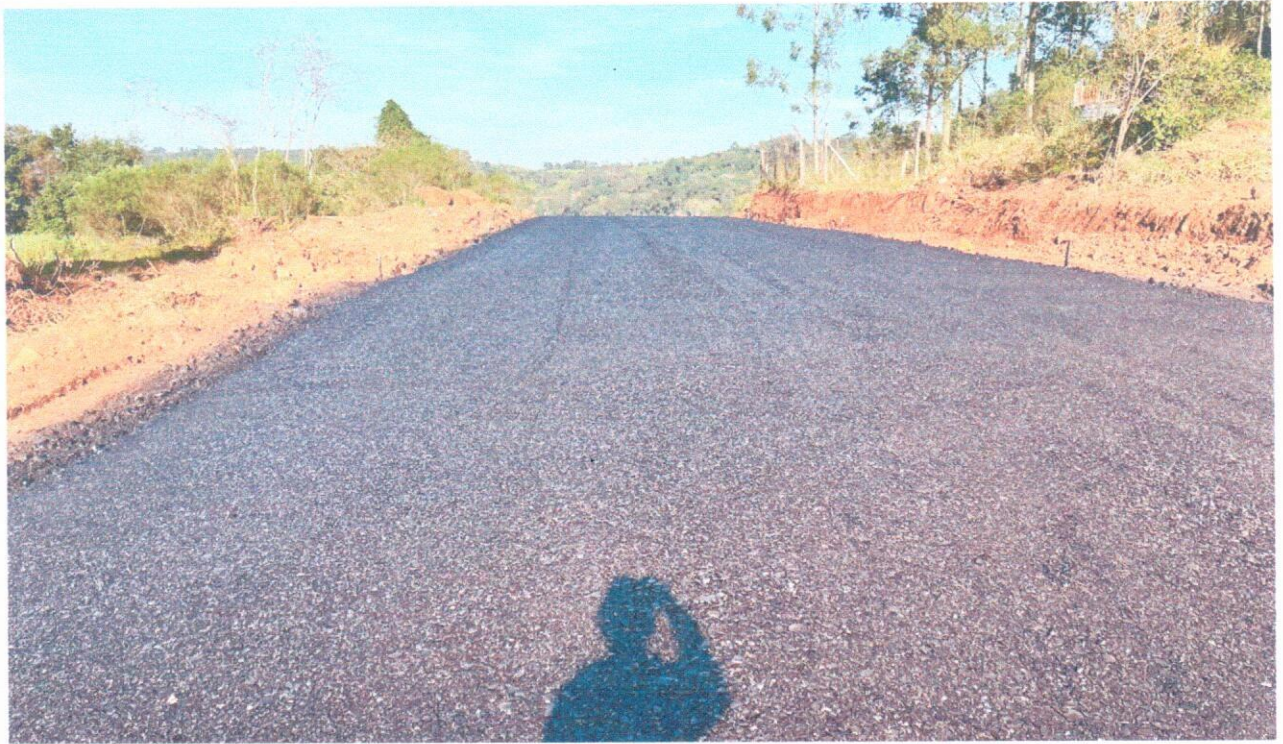

QW R



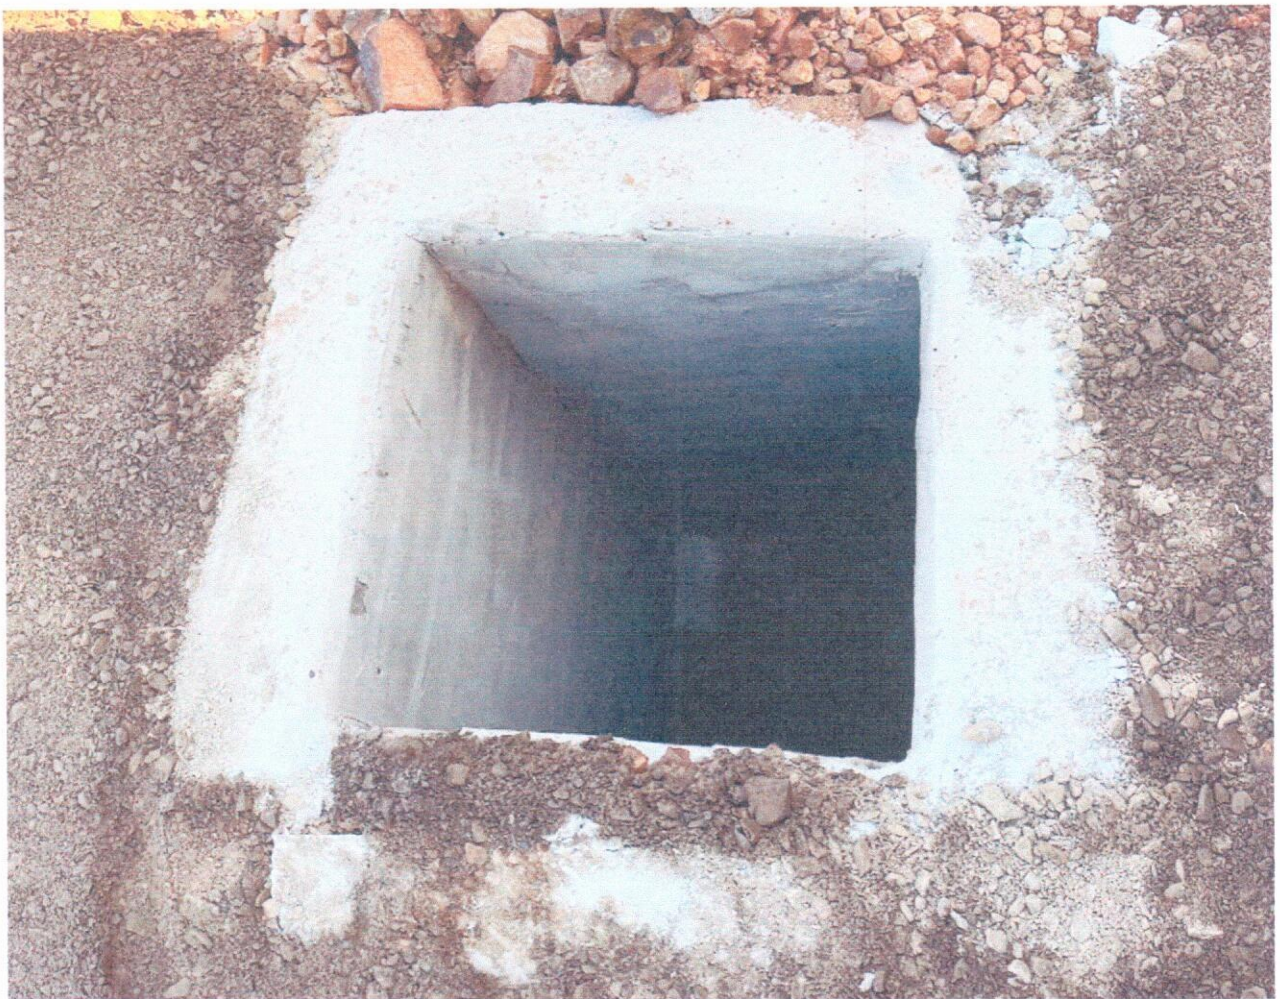

*Handwritten initials or signature in blue ink.*





Irati, 24 DE JULHO de 2024.

*Fabiana Grando*

**Eng. Fabiana Grando**  
CREA/SC 125595-6



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| <b>FOLHA :</b> 11   |                                | <b>DATA</b> 21/06/2024   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>OBRA</b>   |                                | <b>CONTRATO N.º</b>  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |                                | 081/2024   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>CONSTRUTORA</b>  |                                | <b>TOMADOR</b>   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| VIA ASFALTOS LTDA   |                                | MUNICÍPIO DE IRATI-SC  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>  |                                | <b>DIA DA SEMANA</b>   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM   | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |                                | <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> </tr> </table> |                   | D              | S                  | T | Q | Q | S | S |  |  |  |  |  | X |  |
| D   | S                              | T  | Q                 | Q              | S                  | S |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |                                |  |                   |                | X                  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE   | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |                                | X  | X                 |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE   |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM  | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO   | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |

|  |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| <b>FOLHA :</b> 12                            |                                | <b>DATA</b> 22/06/2024   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>                         |                                | <b>DIA DA SEMANA</b>   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM      | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |                                | <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table> |                   | D              | S                  | T | Q | Q | S | S |  |  |  |  |  |  | X |
| D  | S                              | T  | Q                 | Q              | S                  | S |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |                                |  |                   |                |                    | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| CORTE NO PAVIMENTO                           | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE   | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| DESCANSO SEMANAL- SEM ATIVIDADES             |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| RETROESCAVADEIRA                             | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM  | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR                       | PEDREIRO   | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |                                |  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| FOLHA : 13  |             | DATA 23/06/2024          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| OBRA  |             | CONTRATO N.º             |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M²   |             | 081/2024                 |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUTORA   |             | TOMADOR                  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| VIA ASFALTOS LTDA   |             | MUNICÍPIO DE IRATI-SC    |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| TEMPO (CLIMA)   |             | DIA DA SEMANA            |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | BOM         | <input type="checkbox"/> | CHUVA             |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>  |             | <input type="checkbox"/> | SEM ATIVIDADES    |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |             |                          |                   | D              | S                  | T | Q | Q | S | S | X |  |  |  |  |  |  |
| D   | S           | T                        | Q                 | Q              | S                  | S |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| X   |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO   | EXECUÇÃO DE BASE         | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| DESCANSO SEMANAL- SEM ATIVIDADES  |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA | ROLO TANDEM              | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| ENCARREGADO   | OPERADOR    | PEDREIRO                 | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |             |                          |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

|   |             |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| FOLHA : 14  |             | DATA 24/06/2024                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| TEMPO (CLIMA)   |             | DIA DA SEMANA                       |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>  | BOM         | <input checked="" type="checkbox"/> | CHUVA             |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>  |             | <input type="checkbox"/>            | SEM ATIVIDADES    |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |             |                                     |                   | D              | S                  | T | Q | Q | S | S |  | X |  |  |  |  |  |
| D   | S           | T                                   | Q                 | Q              | S                  | S |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   | X           |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |             |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO   | EXECUÇÃO DE BASE                    | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |             |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| CHUVA SEM ATIVIDADES  |             |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |             |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA | ROLO TANDEM                         | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |             |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |             |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| ENCARREGADO   | OPERADOR    | PEDREIRO                            | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|   |             |                                     |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|








**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 17   |                                | <b>DATA</b> 27/06/2024                  |                   |
| OBRA  |                                | CONTRATO N.º                            |                   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |                                | 081/2024                                |                   |
| CONSTRUTORA   |                                | TOMADOR                                 |                   |
| VIA ASFALTOS LTDA   |                                | MUNICÍPIO DE IRATI-SC                   |                   |
| TEMPO (CLIMA)   |                                | DIA DA SEMANA                           |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM   | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   | X                 |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                                |   |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM |
|   |                                |   |                   |
| SINALIZAÇÃO   |                                |   |                   |
| IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO  |                                |   |                   |
| TERRENO MOLHADO - SEM ATIVIDADES  |                                |   |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                                |   |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM                             | ROLO PNEUMÁTICO   |
|   |                                |   |                   |
| VIBROACABADORA  |                                |   |                   |
| ESPARGIDOR  |                                |   |                   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                                |   |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO                                | MOROTISTA         |
|   |                                |   |                   |
| RASTELEIRO  |                                |   |                   |
| SERVENTE  |                                |   |                   |

|  |                                |   |                   |
|--|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 18                            |                                | <b>DATA</b> 28/06/2024                  |                   |
| TEMPO (CLIMA)                                |                                | DIA DA SEMANA                           |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM      | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                   |
|  |                                |   |                   |
|  |                                |   | X                 |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |                                |   |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO                           | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM |
|  |                                |   |                   |
| SINALIZAÇÃO                                  |                                |   |                   |
| IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO                           |                                |   |                   |
| TERRENO MOLHADO - SEM ATIVIDADES             |                                |   |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |                                |   |                   |
| RETROESCAVADEIRA                             | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM                             | ROLO PNEUMÁTICO   |
|  |                                |   |                   |
| VIBROACABADORA                               |                                |   |                   |
| ESPARGIDOR                                   |                                |   |                   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |                                |   |                   |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR                       | PEDREIRO                                | MOROTISTA         |
|  |                                |   |                   |
| RASTELEIRO                                   |                                |   |                   |
| SERVENTE                                     |                                |   |                   |


|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>Engº Thiago F. S. Dutra<br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | Fabiana Grando<br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | Marcelo Invernizzi<br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|---|--|---|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|-------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| <b>FOLHA :</b> 19   |             | <b>DATA</b> 29/06/2024  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| OBRA  |             | CONTRATO N.º  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |             | 081/2024  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| CONSTRUTORA   |             | TOMADOR   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| VIA ASFALTOS LTDA   |             | MUNICÍPIO DE IRATI-SC   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| TEMPO (CLIMA)   |             | DIA DA SEMANA   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | BOM         | <input type="checkbox"/>  | CHUVA             |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <input type="checkbox"/>  |             | <input type="checkbox"/>  | SEM ATIVIDADES    |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |             | <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table> |                   | D              | S                  | T | Q | Q | S | S |  |  |  |  |  |  | X |
| D   | S           | T   | Q                 | Q              | S                  | S |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |             |   |                   |                |                    | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO   | EXECUÇÃO DE BASE  | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES   |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA | ROLO TANDEM   | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR    | PEDREIRO  | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |

|  |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>FOLHA :</b> 20                            |             | <b>DATA</b> 30/06/2024  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| TEMPO (CLIMA)                                |             | DIA DA SEMANA   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>          | BOM         | <input type="checkbox"/>  | CHUVA             |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                     |             | <input type="checkbox"/>  | SEM ATIVIDADES    |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |             | <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                   | D              | S                  | T | Q | Q | S | S | X |  |  |  |  |  |  |
| D  | S           | T   | Q                 | Q              | S                  | S |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| X  |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| CORTE NO PAVIMENTO                           | ESCAVAÇÃO   | EXECUÇÃO DE BASE  | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES            |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| RETROESCAVADEIRA                             | ESCAVADEIRA | ROLO TANDEM   | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR    | PEDREIRO  | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 58   |                                | <b>DATA</b> 01/07/2024                  |                   |
| OBRA  |                                | CONTRATO N.º                            |                   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |                                | 081/2024                                |                   |
| CONSTRUTORA   |                                | TOMADOR                                 |                   |
| VIA ASFALTOS LTDA   |                                | MUNICÍPIO DE IRATI-SC                   |                   |
| TEMPO (CLIMA)   |                                | DIA DA SEMANA                           |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM   | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                                |   |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM |
|   |                                | X                                       | X                 |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE   |                                |   |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                                |   |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM                             | MOTO NOVELADORA   |
|   | X                              | X                                       | X                 |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                                |   |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO                                | MOROTISTA         |
| 1   | 3                              | 1                                       |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |

|   |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 59                                       |                                | <b>DATA</b> 02/07/2024                  |                   |
| TEMPO (CLIMA)   |                                | DIA DA SEMANA                           |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM                 | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>            |                                |   |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO                                      | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM |
|   |                                | X                                       | X                 |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE |                                |   |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>                      |                                |   |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM                             | MOTO NOVELADORA   |
|   | X                              | X                                       | X                 |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                             |                                |   |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO                                | MOROTISTA         |
| 1   | 3                              | 1                                       |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   |                   |


|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 60   |                                | <b>DATA</b> 03/07/2024                  |                   |
| OBRA  |                                | CONTRATO N.º                            |                   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |                                | 081/2024                                |                   |
| CONSTRUTORA   |                                | TOMADOR                                 |                   |
| VIA ASFALTOS LTDA   |                                | MUNICÍPIO DE IRATI-SC                   |                   |
| TEMPO (CLIMA)   |                                | DIA DA SEMANA                           |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM   | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                | <b>X</b>                                |                   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                                |   |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM |
|   |                                | <b>X</b>                                | <b>X</b>          |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE   |                                |   |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                                |   |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM                             | MOTO NOVELADORA   |
|   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>          |
|   |                                |   | <b>X</b>          |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                                |   |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO                                | MOROTISTA         |
| <b>1</b>  | <b>3</b>                       | <b>1</b>                                |                   |
|   |                                |   | <b>3</b>          |

|   |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 61                                       |                                | <b>DATA</b> 04/07/2024                  |                   |
| TEMPO (CLIMA)   |                                | DIA DA SEMANA                           |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM                 | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                | <b>X</b>                                |                   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>            |                                |   |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO                                      | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM |
|   |                                | <b>X</b>                                | <b>X</b>          |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE |                                |   |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>                      |                                |   |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM                             | MOTO NOVELADORA   |
|   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>          |
|   |                                |   | <b>X</b>          |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                             |                                |   |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO                                | MOROTISTA         |
| <b>1</b>  | <b>3</b>                       | <b>1</b>                                |                   |
|   |                                |   | <b>3</b>          |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |   |                        |                                     |
|---|---|------------------------|-------------------------------------|
| <b>FOLHA :</b> 62   |   | <b>DATA</b> 05/07/2024 |                                     |
| OBRA  |   | CONTRATO N.º           |                                     |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |   | 081/2024               |                                     |
| CONSTRUTORA   |   | TOMADOR                |                                     |
| VIA ASFALTOS LTDA   |   | MUNICÍPIO DE IRATI-SC  |                                     |
| TEMPO (CLIMA)   |   | DIA DA SEMANA          |                                     |
| BOM   | <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA | SEM ATIVIDADES         |                                     |
|   |   |                        |                                     |
|   |   |                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |   |                        |                                     |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                                 | EXECUÇÃO DE BASE       | SERV. DE DRENAGEM                   |
|   |   |                        |                                     |
| CHUVA - SEM ATIVIDADES  |   |                        |                                     |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |   |                        |                                     |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                               | ROLO TANDEM            | ROLO PNEUMÁTICO                     |
|   |   |                        |                                     |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |   |                        |                                     |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                                  | PEDREIRO               | MOROTISTA                           |
|   |   |                        |                                     |

|  |   |                        |                                     |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|
| <b>FOLHA :</b> 63                            |   | <b>DATA</b> 06/07/2024 |                                     |
| TEMPO (CLIMA)                                |   | DIA DA SEMANA          |                                     |
| BOM  | CHUVA <input checked="" type="checkbox"/> | SEM ATIVIDADES         |                                     |
|  |   |                        |                                     |
|  |   |                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |   |                        |                                     |
| CORTE NO PAVIMENTO                           | ESCAVAÇÃO                                 | EXECUÇÃO DE BASE       | SERV. DE DRENAGEM                   |
|  |   |                        |                                     |
| DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES            |   |                        |                                     |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |   |                        |                                     |
| RETROESCAVADEIRA                             | ESCAVADEIRA                               | ROLO TANDEM            | ROLO PNEUMÁTICO                     |
|  |   |                        |                                     |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |   |                        |                                     |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR                                  | PEDREIRO               | MOROTISTA                           |
|  |   |                        |                                     |


|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |   |                        |                   |
|---|---|------------------------|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 64   |   | <b>DATA</b> 07/07/2024 |                   |
| <b>OBRA</b>   |   | <b>CONTRATO N.º</b>    |                   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |   | 081/2024               |                   |
| <b>CONSTRUTORA</b>  |   | <b>TOMADOR</b>         |                   |
| VIA ASFALTOS LTDA   |   | MUNICÍPIO DE IRATI-SC  |                   |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>  |   | <b>DIA DA SEMANA</b>   |                   |
| BOM   | CHUVA <input checked="" type="checkbox"/> | SEM ATIVIDADES         |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |   |                        |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                                 | EXECUÇÃO DE BASE       | SERV. DE DRENAGEM |
|   |   |                        |                   |
| DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES   |   |                        |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |   |                        |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                               | ROLO TANDEM            | ROLO PNEUMÁTICO   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |   |                        |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                                  | PEDREIRO               | MOROTISTA         |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |

|   |                                     |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FOLHA :</b> 65                                       |                                     | <b>DATA</b> 08/07/2024              |                                     |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>                                    |                                     | <b>DIA DA SEMANA</b>                |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                     | BOM                                 | CHUVA                               | SEM ATIVIDADES                      |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>            |                                     |                                     |                                     |
| CORTE NO PAVIMENTO                                      | ESCAVAÇÃO                           | EXECUÇÃO DE BASE                    | SERV. DE DRENAGEM                   |
|   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE |                                     |                                     |                                     |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>                      |                                     |                                     |                                     |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                         | ROLO TANDEM                         | MOTO NOVELADORA                     |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                             |                                     |                                     |                                     |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                            | PEDREIRO                            | MOROTISTA                           |
| 1   | 3                                   | 1                                   |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |
|   |                                     |                                     |                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |   |                        |                   |
|---|---|------------------------|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 66   |   | <b>DATA</b> 09/07/2024 |                   |
| OBRA  |   | CONTRATO N.º           |                   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |   | 081/2024               |                   |
| CONSTRUTORA   |   | TOMADOR                |                   |
| VIA ASFALTOS LTDA   |   | MUNICÍPIO DE IRATI-SC  |                   |
| TEMPO (CLIMA)   |   | DIA DA SEMANA          |                   |
| BOM   | <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA | SEM ATIVIDADES         |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |   |                        |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                                 | EXECUÇÃO DE BASE       | SERV. DE DRENAGEM |
|   |   |                        |                   |
| CHUVA - SEM ATIVIDADES  |   |                        |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |   |                        |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                               | ROLO TANDEM            | ROLO PNEUMÁTICO   |
|   |   |                        |                   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |   |                        |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                                  | PEDREIRO               | MOROTISTA         |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |
|   |   |                        |                   |

|  |   |                        |                   |
|--|---|------------------------|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 67                            |   | <b>DATA</b> 10/07/2024 |                   |
| TEMPO (CLIMA)                                |   | DIA DA SEMANA          |                   |
| BOM  | <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA | SEM ATIVIDADES         |                   |
|  |   |                        |                   |
|  |   |                        |                   |
|  |   |                        |                   |
|  |   |                        |                   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |   |                        |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO                           | ESCAVAÇÃO                                 | EXECUÇÃO DE BASE       | SERV. DE DRENAGEM |
|  |   |                        |                   |
| CHUVA - SEM ATIVIDADES                       |   |                        |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |   |                        |                   |
| RETROESCAVADEIRA                             | ESCAVADEIRA                               | ROLO TANDEM            | ROLO PNEUMÁTICO   |
|  |   |                        |                   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |   |                        |                   |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR                                  | PEDREIRO               | MOROTISTA         |
|  |   |                        |                   |
|  |   |                        |                   |
|  |   |                        |                   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



## DIÁRIO DE OBRAS

|   |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---|----------|---|---|
| <b>FOLHA :</b>  | <b>1</b>                 |                  | <b>DATA</b>                  | <b>11/07/2024</b> |                    |   |          |   |   |
| <b>OBRA</b>   | <b>CONTRATO N.º</b>      |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00MP | <b>081/2024</b>          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| <b>CONSTRUTORA</b>  | <b>VIA ASFALTOS LTDA</b> |                  | <b>TOMADOR</b>               |                   |                    |   |          |   |   |
|   |                          |                  | <b>MUNICÍPIO DE IRATI-SC</b> |                   |                    |   |          |   |   |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>  |                          |                  | <b>DIA DA SEMANA</b>         |                   |                    |   |          |   |   |
| BOM   | <b>X</b>                 | CHUVA            |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| SEM ATIVIDADES  |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
|   |                          |                  | D                            | S                 | T                  | Q | Q        | S | S |
|   |                          |                  |                              |                   |                    |   | <b>X</b> |   |   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                | EXECUÇÃO DE BASE | SERV. DE DRENAGEM            | SINALIZAÇÃO       | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |          |   |   |
|   |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| CHUVA - SEM ATIVIDADES  |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA              | ROLO TANDEM      | ROLO PNEUMÁTICO              | VIBROACABADORA    | ESPARGIDOR         |   |          |   |   |
|   |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                 | PEDREIRO         | MOROTISTA                    | RASTELEIRO        | SERVENTE           |   |          |   |   |
|   |                          |                  |                              |                   |                    |   |          |   |   |

|  |                      |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|---|----------|---|
| <b>FOLHA :</b>                               | <b>2</b>             |                  | <b>DATA</b>       | <b>12/07/2024</b> |                    |          |   |          |   |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>                         | <b>DIA DA SEMANA</b> |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
| BOM  | <b>X</b>             | CHUVA            |                   |                   |                    |          |   |          |   |
| SEM ATIVIDADES                               |                      |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
|  |                      |                  | D                 | S                 | T                  | Q        | Q | S        | S |
|  |                      |                  |                   |                   |                    |          |   | <b>X</b> |   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |                      |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
| CORTE NO PAVIMENTO                           | ESCAVAÇÃO            | EXECUÇÃO DE BASE | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO       | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |          |   |          |   |
|  |                      |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
| CHUVA - SEM ATIVIDADES                       |                      |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |                      |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
| RETROESCAVADEIRA                             | ESCAVADEIRA          | ROLO TANDEM      | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA    | ESPARGIDOR         |          |   |          |   |
|  |                      |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |                      |                  |                   |                   |                    |          |   |          |   |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR             | PEDREIRO         | MOROTISTA         | RASTELEIRO        | SERVENTE           |          |   |          |   |
| <b>1</b>                                     |                      |                  |                   |                   |                    | <b>2</b> |   |          |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |   |                        |                                     |
|---|---|------------------------|-------------------------------------|
| <b>FOLHA :</b> 3  |   | <b>DATA</b> 13/07/2024 |                                     |
| OBRA  |   | CONTRATO N.º           |                                     |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |   | 081/2024               |                                     |
| CONSTRUTORA   |   | TOMADOR                |                                     |
| VIA ASFALTOS LTDA   |   | MUNICÍPIO DE IRATI-SC  |                                     |
| TEMPO (CLIMA)   |   | DIA DA SEMANA          |                                     |
| BOM   | CHUVA <input checked="" type="checkbox"/> | SEM ATIVIDADES         |                                     |
|   |   |                        |                                     |
|   |   |                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |   |                        |                                     |
| CORTES/ ATERROS   | REGULA                                    | EXECUÇÃO DE BASE       | SERV. DE DRENAGEM                   |
|   |   |                        |                                     |
| DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES   |   |                        |                                     |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |   |                        |                                     |
| MOTONOVELADORA  | ESCAVADEIRA                               | ROLO TANDEM            | ROLO PNEUMÁTICO                     |
|   |   |                        |                                     |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |   |                        |                                     |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                                  | PEDREIRO               | MOROTISTA                           |
|   |   |                        |                                     |

|  |   |                        |                                     |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|
| <b>FOLHA :</b> 4                             |   | <b>DATA</b> 14/07/2024 |                                     |
| TEMPO (CLIMA)                                |   | DIA DA SEMANA          |                                     |
| BOM  | CHUVA <input checked="" type="checkbox"/> | SEM ATIVIDADES         |                                     |
|  |   |                        |                                     |
|  |   |                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |   |                        |                                     |
| CORTES/ ATERROS                              | REGULA                                    | EXECUÇÃO DE BASE       | SERV. DE DRENAGEM                   |
|  |   |                        |                                     |
| DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES            |   |                        |                                     |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |   |                        |                                     |
| MOTONOVELADORA                               | ESCAVADEIRA                               | ROLO TANDEM            | ROLO PNEUMÁTICO                     |
|  |   |                        |                                     |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |   |                        |                                     |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR                                  | PEDREIRO               | MOROTISTA                           |
|  |   |                        |                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



DIÁRIO DE OBRAS

|   |             |                       |                   |                |                    |   |   |   |
|---|-------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|
| FOLHA : 5   |             | DATA 15/07/2024       |                   |                |                    |   |   |   |
| OBRA  |             | CONTRATO N.º          |                   |                |                    |   |   |   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |             | 081/2024              |                   |                |                    |   |   |   |
| CONSTRUTORA   |             | TOMADOR               |                   |                |                    |   |   |   |
| VIA ASFALTOS LTDA   |             | MUNICÍPIO DE IRATI-SC |                   |                |                    |   |   |   |
| TEMPO (CLIMA)   |             | DIA DA SEMANA         |                   |                |                    |   |   |   |
| X   | BOM         |                       | CHUVA             | SEM ATIVIDADES |                    |   |   |   |
|   |             | D                     | S                 | T              | Q                  | Q | S | S |
|   |             |                       | X                 |                |                    |   |   |   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |             |                       |                   |                |                    |   |   |   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO   | EXECUÇÃO DE BASE      | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |
|   |             | X                     | X                 |                |                    |   |   |   |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE   |             |                       |                   |                |                    |   |   |   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |             |                       |                   |                |                    |   |   |   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA | ROLO TANDEM           | MOTO NOVELADORA   | CAMINHÃO PIPA  | ESPARGIDOR         |   |   |   |
|   | X           | X                     | X                 | X              |                    |   |   |   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |             |                       |                   |                |                    |   |   |   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR    | PEDREIRO              | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |
| 1   | 3           | 1                     |                   |                | 3                  |   |   |   |

|   |             |                  |                   |                |                    |   |   |   |
|---|-------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|
| FOLHA : 6   |             | DATA 16/07/2024  |                   |                |                    |   |   |   |
| TEMPO (CLIMA)   |             | DIA DA SEMANA    |                   |                |                    |   |   |   |
| X   | BOM         |                  | CHUVA             | SEM ATIVIDADES |                    |   |   |   |
|   |             | D                | S                 | T              | Q                  | Q | S | S |
|   |             |                  |                   | X              |                    |   |   |   |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>            |             |                  |                   |                |                    |   |   |   |
| CORTE NO PAVIMENTO                                      | ESCAVAÇÃO   | EXECUÇÃO DE BASE | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |
|   |             | X                | X                 |                |                    |   |   |   |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE |             |                  |                   |                |                    |   |   |   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>                      |             |                  |                   |                |                    |   |   |   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA | ROLO TANDEM      | MOTO NOVELADORA   | CAMINHÃO PIPA  | ESPARGIDOR         |   |   |   |
|   | X           | X                | X                 | X              |                    |   |   |   |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                             |             |                  |                   |                |                    |   |   |   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR    | PEDREIRO         | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |
| 1   | 3           | 1                |                   |                | 3                  |   |   |   |


|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>Engº Thiago F. S. Dutra<br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <br>Fabiana Grando<br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <br>Marcelo Invernizzi<br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|---|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 7  |                                | <b>DATA</b> 17/07/2024                  |                   |
| <b>OBRA</b>   |                                | <b>CONTRATO N.º</b>                     |                   |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |                                | 081/2024                                |                   |
| <b>CONSTRUTORA</b>  |                                | <b>TOMADOR</b>                          |                   |
| VIA ASFALTOS LTDA   |                                | MUNICÍPIO DE IRATI-SC                   |                   |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>  |                                | <b>DIA DA SEMANA</b>                    |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM   | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   | X                 |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                                |   |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM |
|   |                                | X                                       | X                 |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE   |                                |   |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                                |   |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM                             | MOTO NOVELADORA   |
|   | X                              | X                                       | X                 |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                                |   |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO                                | MOROTISTA         |
| 1   | 3                              | 1                                       |                   |
|   |                                |   | SERVENTE          |
|   |                                |   | 3                 |

|   |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>FOLHA :</b> 8  |                                | <b>DATA</b> 18/07/2024                  |                   |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>                                    |                                | <b>DIA DA SEMANA</b>                    |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM                 | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                   |
|   |                                |   |                   |
|   |                                |   | X                 |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>            |                                |   |                   |
| CORTE NO PAVIMENTO                                      | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM |
|   |                                | X                                       | X                 |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE |                                |   |                   |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>                      |                                |   |                   |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM                             | MOTO NOVELADORA   |
|   | X                              | X                                       | X                 |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                             |                                |   |                   |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO                                | MOROTISTA         |
| 1   | 3                              | 1                                       |                   |
|   |                                |   | SERVENTE          |
|   |                                |   | 3                 |


|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |                                     |   |                                     |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>FOLHA :</b> 9  |                                     | <b>DATA</b> 19/07/2024                  |                                     |
| OBRA  |                                     | CONTRATO N.º                            |                                     |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |                                     | 081/2024                                |                                     |
| CONSTRUTORA   |                                     | TOMADOR                                 |                                     |
| VIA ASFALTOS LTDA   |                                     | MUNICÍPIO DE IRATI-SC                   |                                     |
| TEMPO (CLIMA)   |                                     | DIA DA SEMANA                           |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM   | <input type="checkbox"/> CHUVA      | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                                     |
|   |                                     |   |                                     |
|   |                                     |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                                     |   |                                     |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                           | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM                   |
|   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE   |                                     |   |                                     |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                                     |   |                                     |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                         | ROLO TANDEM                             | MOTO NOVELADORA                     |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |                                     |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                                     |   |                                     |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                            | PEDREIRO                                | MOROTISTA                           |
| 1   | 3                                   | 1                                       |                                     |
|   |                                     |   | 3                                   |

|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| <b>FOLHA :</b> 10                            |   | <b>DATA</b> 20/07/2024                  |                                     |
| TEMPO (CLIMA)                                |   | DIA DA SEMANA                           |                                     |
| <input type="checkbox"/> BOM                 | <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES |                                     |
|  |   |   |                                     |
|  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |   |   |                                     |
| CORTES/ ATERROS                              | REGULA                                    | EXECUÇÃO DE BASE                        | SERV. DE DRENAGEM                   |
|  |   |   |                                     |
| DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES            |   |   |                                     |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |   |   |                                     |
| MOTONVELADORA                                | ESCAVADEIRA                               | ROLO TANDEM                             | ROLO PNEUMÁTICO                     |
|  |   |   |                                     |
|  |   |   |                                     |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |   |   |                                     |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR                                  | PEDREIRO                                | MOROTISTA                           |
|  |   |   |                                     |
|  |   |   |                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|





Nome da Empresa: VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ nº: 49.539.605/0001-44

Endereço: COLONIA COLONIA BACIA S/N, BAIRRO INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

### DIÁRIO DE OBRAS

|   |                |                       |                   |                |                    |
|---|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| FOLHA : 11  |                | DATA 21/07/2024       |                   |                |                    |
| OBRA  |                | CONTRATO N.º          |                   |                |                    |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00M² |                | 081/2024              |                   |                |                    |
| CONSTRUTORA   |                | TOMADOR               |                   |                |                    |
| VIA ASFALTOS LTDA   |                | MUNICÍPIO DE IRATI-SC |                   |                |                    |
| TEMPO (CLIMA)   |                | DIA DA SEMANA         |                   |                |                    |
| BOM   | CHUVA <b>X</b> | SEM ATIVIDADES        |                   |                |                    |
|   |                |                       |                   |                |                    |
|   |                |                       |                   |                |                    |
|   |                |                       |                   |                |                    |
|   |                |                       |                   |                |                    |
|   |                |                       |                   |                |                    |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                |                       |                   |                |                    |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO      | EXECUÇÃO DE BASE      | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |
|   |                |                       |                   |                |                    |
| DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES   |                |                       |                   |                |                    |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                |                       |                   |                |                    |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA    | ROLO TANDEM           | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |
|   |                |                       |                   |                |                    |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                |                       |                   |                |                    |
| ENCARREGADO   | OPERADOR       | PEDREIRO              | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |
|   |                |                       |                   |                |                    |

|  |             |                  |                   |               |                    |
|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| FOLHA : 12                                   |             | DATA 22/07/2024  |                   |               |                    |
| TEMPO (CLIMA)                                |             | DIA DA SEMANA    |                   |               |                    |
| <b>X</b>                                     | BOM         | CHUVA            | SEM ATIVIDADES    |               |                    |
|  |             |                  |                   |               |                    |
|  |             |                  |                   |               |                    |
|  |             |                  |                   |               |                    |
|  |             |                  |                   |               |                    |
|  |             |                  |                   |               |                    |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |             |                  |                   |               |                    |
| CORTE NO PAVIMENTO                           | ESCAVAÇÃO   | EXECUÇÃO DE BASE | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO   | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |
|  |             | <b>X</b>         |                   |               |                    |
| EXECUÇÃO DE BASE                             |             |                  |                   |               |                    |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |             |                  |                   |               |                    |
| RETROESCAVADEIRA                             | ESCAVADEIRA | ROLO TANDEM      | MOTO NOVELADORA   | CAMINHÃO PIPA | ESPARGIDOR         |
|  |             | <b>X</b>         | <b>X</b>          | <b>X</b>      |                    |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |             |                  |                   |               |                    |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR    | PEDREIRO         | MOROTISTA         | RASTELEIRO    | SERVENTE           |
| <b>1</b>                                     | <b>3</b>    | <b>1</b>         |                   |               | <b>3</b>           |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>Engº Thiago F. S. Dutra<br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <br>Fabiana Grando<br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <br>Marcelo Invernizzi<br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|--|---|



**DIÁRIO DE OBRAS**

|   |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|---|--------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| <b>FOLHA :</b> 13   |                                | <b>DATA</b> 23/07/2024  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>OBRA</b>   |                                | <b>CONTRATO N.º</b>   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO JORGE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IRATI - SC, COM EXTENSÃO DE 1.712,00MP |                                | 081/2024  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>CONSTRUTORA</b>  |                                | <b>TOMADOR</b>  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| VIA ASFALTOS LTDA   |                                | MUNICÍPIO DE IRATI-SC   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>  |                                | <b>DIA DA SEMANA</b>  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM   | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|   |                                | <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                   | D              | S                  | T | Q | Q | S | S |  |  | X |  |  |  |  |
| D   | S                              | T   | Q                 | Q              | S                  | S |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|   |                                | X   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b>  |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| CORTE NO PAVIMENTO  | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE  | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|   |                                |   |                   |                | X                  |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| IMPRIMAÇÃO DE BASE  |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>  |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| RETROESCAVADEIRA  | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM   | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|   |                                |   |                   |                | X                  |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>   |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| ENCARREGADO   | OPERADOR                       | PEDREIRO  | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| 1   | 1                              |   | 1                 |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |

|  |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>FOLHA :</b> 14                            |                                | <b>DATA</b> 24/07/2024  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>TEMPO (CLIMA)</b>                         |                                | <b>DIA DA SEMANA</b>  |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM      | <input type="checkbox"/> CHUVA | <input type="checkbox"/> SEM ATIVIDADES   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |                                | <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                   | D              | S                  | T | Q | Q | S | S |  |  |  | X |  |  |  |
| D  | S                              | T   | Q                 | Q              | S                  | S |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |                                |   | X                 |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO</b> |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| CORTE NO PAVIMENTO                           | ESCAVAÇÃO                      | EXECUÇÃO DE BASE  | SERV. DE DRENAGEM | SINALIZAÇÃO    | IMPRIMAÇÃO/LIGAÇÃO |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| CHUVA SEM ATIVIDADES                         |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS</b>           |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| RETROESCAVADEIRA                             | ESCAVADEIRA                    | ROLO TANDEM   | ROLO PNEUMÁTICO   | VIBROACABADORA | ESPARGIDOR         |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>3 - EQUIPE UTILIZADA</b>                  |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ENCARREGADO                                  | OPERADOR                       | PEDREIRO  | MOROTISTA         | RASTELEIRO     | SERVENTE           |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |                                |   |                   |                |                    |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Engº Thiago F. S. Dutra</b><br>Resp. Técnico Empresa<br>CREA SC - 168098-9 | <b>Fabiana Grando</b><br>Engenheira Civil Prefeitura Irati-SC<br>CREA PR 125595-6 | <b>Marcelo Invernizzi</b><br>Responsável Legal<br>CPF 083.679.009-01 |
|--|---|--|



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 49.539.605/0001-44  
**Razão Social:** VIA ASFALTOS LTDA  
**Endereço:** - OUTRO LINHA COLONIA BACIA 1 - - / CORDILHEIRA ALTA / SC / 89819-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/07/2024 a 08/08/2024

**Certificação Número:** 2024071012356064215900

Informação obtida em 15/07/2024 11:01:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VIA ASFALTOS LTDA CNPJ: 49539605000144

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 11721 - VIA ASFALTOS LTDA  
Endereço: Linha COLONIA BACIA - Bairro INTERIOR - CEP 89.819-000

Código de Controle

CWKN2Q6FQXPWTTTF1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cordilheira Alta (SC), 10 de Junho de 2024





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): VIA ASFALTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 49.539.605/0001-44

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 240140084535793  
Data de emissão: 16/03/2024 10:59:26  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 12/09/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 10/06/2024 14:27:23

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2579773  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: VIA ASFALTOS LTDA**

Raiz do CNPJ: 49.539.605

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : CORDILHEIRA ALTA

Endereço da sede : COLONIA BACIA, SN, INTERIOR, CORDILHEIRA ALTA-SC

Certidão emitida às 01:09 de 22/07/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.539.605/0001-44

Certidão n°: 19696339/2024

Expedição: 22/03/2024, às 14:12:15

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.539.605/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIA ASFALTOS LTDA**  
**CNPJ: 49.539.605/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:11:17 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **76B6.D39B.564B.750E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
